EJECUCION DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR PRODUCCIÓN

El Sector Producción viene interviniendo con proyectos de inversión pública a través del pliego Produce con la ejecución del proyecto INNOVATE que promueve y apoya la innovación, la investigación y el fortalecimiento de capacidades a través de fondos concursales que contribuyan a mejorar la competitividad del país; el pliego del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), viene interviniendo con proyectos en materia de innovación y transferencia tecnológica; el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) que contempla principalmente la ejecución de obras de mejoramiento de Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPA's) con la finalidad de que estos se adecuen a lo exigido en las normas sanitarias en materia pesquera ; el pliego del Organismo de Sanidad pesquera (SANIPES) viene interviniendo con proyectos en materia de regulación y sanidad pesquera; en cuanto al pliego del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) vienen formulando estudios de pre-inversión de Proyectos de inversión pública en materia de servicios de investigación científica y tecnológica.

PRIMER TRIMESTRE - 2016

El desempeño que tuvo la ejecución en el I-Trimestre en términos acumulados fue del 13% con respecto al presupuesto del Sector, que equivale a S/ 46.4 millones ejecutados; lo que equivale que a S/ 23.2 millones más de lo ejecutado en el I- Trimestre del año 2015 que fue de S/ 23.1 millones.

PLIEGOS / UNIDADES EJECUTORAS	PIA 2016	PIM 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE - 2016	Avance %
PRODUCE	59,994,780	52,437,747	14,907,062	28%
FONDEPES	73,538,258	86,080,998	4,521,312	5%
ITP	164,325,709	204,237,900	26,927,976	13%
SANIPES(*)	295,748	9,123,397	81,000	1%
IMARPE(*)	0	1,602,792	0	0%
TOTAL	**298,154,495**	**353,482,834**	**46,437,351**	**13%**

(*) Presupuesto asignado para elaboración de estudios de pre inversión

Gráficamente se puede apreciar la ejecución mensual que corresponde al primer trimestre del presente año:

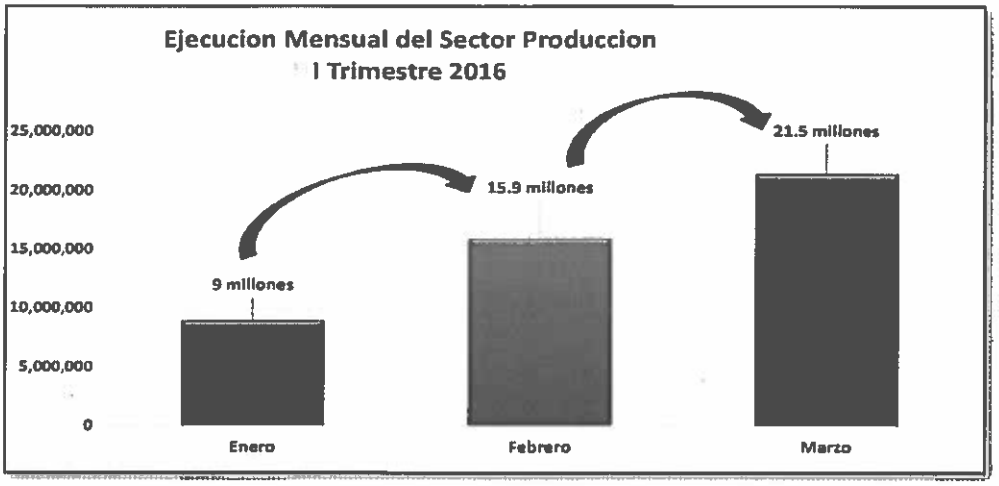

La cartera de proyectos que vienen siendo ejecutados por el Sector Producción a través de sus pliegos, se detalla en el siguiente cuadro:

N°	DATOS DEL PROYECTO			EJECUCION DEL PIP				EJECUCION FISICA (INFRAESTRUCTURA)		EJECUCION PRESUPUESTAL 2016			I TRIMESTRE 2016		
	Código SNIP	NOMBRE DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA	MONTO DE INVERSION	EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA - 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA AL I- TRIMESTRE 2016	AVANCE PRESUPUESTAL CON REPECTO AL PIP	AVANCE DE EJECUCION FISICO VALORIZADO A MARZO - 2016	ESTADO DE OBRA A MARZO -2016	PIM 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL I TRIMESTRE - 2016	AVANCE PRESUPUESTAL CON RESPECTO AL PIM 2016. I-TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR
SECTOR PRODUCCION				**788,380,261**	**291,604,582**	**328,744,183**	**42%**	**38%**	**-**	**353,482,834**	**46,437,351**	**13%**	**9,005,006**	**15,965,418**	**21,466,927**
1	159771	INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD	PRODUCE	275,000,000	135,083,022	149,931,828	55%	94%	EJECUCION	51,695,747	14,848,806	29%	4,990,866	5,380,690	4,477,251
2	86364	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA 040-2001- PE - DISTRITO DE SAMANCO - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH	FONDEPES	7,722,070	7,455,528	7,455,528	97%	100%	OBRA FINALIZADO/ LIQUIDACION	5,918	0	0%	0	0	0
3	65901	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD	FONDEPES	14,911,556	19,135,113	13,335,310 (*)	89%	97%	OBRA FINALIZADO/ LIQUIDACION	205,896	0	0%	0	0	0
4	2991	PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	FONDEPES	22,427,780	24,654,060	22,245,798 (*)	99%	78%	EJECUCION	2,586,355	512,100	20%			512,100
5	43137	MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	FONDEPES	10,834,950	10,084,868	10,084,868	93%	79%	OBRA FINALIZADO/ LIQUIDACION	53,009	0	0%	0	0	0
6	221751	ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH	FONDEPES	6,907,550	6,891,802	6,891,802	100%	97%	OBRA FINALIZADO/ LIQUIDACION	15,748	0	0%	0	0	0

N°	DATOS DEL PROYECTO			EJECUCION DEL PIP				EJECUCION FISICA (INFRAESTRUCTURA)		EJECUCION PRESUPUESTAL 2016			I TRIMESTRE 2016		
	Código SNIP	NOMBRE DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA	MONTO DE INVERSION	EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA - 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA AL I- TRIMESTRE 2016	AVANCE PRESUPUESTAL CON REPECTO AL PIP	AVANCE DE EJECUCION FISICO VALORIZADO A MARZO - 2016	ESTADO DE OBRA A MARZO -2016	PIM 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL I TRIMESTRE- 2016	AVANCE PRESUPUESTAL CON RESPECTO AL PIM 2016. I-TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR
7	229798	MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY -PROVINCIA ISLAY - REGION AREQUIPA	FONDEPES	13,411,312	5,340,251	5,402,343	40%	14%	EJECUCION	6,146,968	62,092	1%	0	34,220	27,872
8	65958	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE	FONDEPES	33,660,306	23,912,370	26,173,618	78%	56%	EJECUCION	11,740,454	2,261,248	19%	0	1,583,398	677,850
	272805	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA	FONDEPES	11,547,882	10,307,631	11,173,596	97%	80%	EJECUCION	1,595,742	865,965	54%	0	470	865,495
10	278545	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA	FONDEPES	10,509,159	266,755	305,236	3%	0%	EJECUCION	7,827,589	38,482	0%	2,880	16,506	19,096
11	66931	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO	FONDEPES	21,357,551	164,329	164,329	1%	0%	EJECUCION/ RETIRO DE VIABILIDAD/ FORMULACION	19,027,709	0	0%	0	0	0
12	182813	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA	FONDEPES	20,195,899	405,055	405,055	2%	0%	EJECUCION/ RETIRO DE VIABILIDAD/ FORMULACION	19,039,266	0	0%	0	0	0

N°	DATOS DEL PROYECTO			EJECUCION DEL PIP				EJECUCION FISICA (INFRAESTRUCTURA)		EJECUCION PRESUPUESTAL 2016			I TRIMESTRE 2016		
	Código SNIP	NOMBRE DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA	MONTO DE INVERSION	EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA - 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA AL I- TRIMESTRE 2016	AVANCE PRESUPUESTAL CON REPECTO AL PIP	AVANCE DE EJECUCION FISICO VALORIZADO A MARZO - 2016	ESTADO DE OBRA A MARZO -2016	PIM 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL I TRIMESTRE- 2016	AVANCE PRESUPUESTAL CON RESPECTO AL PIM 2016. I-TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR
13	230133	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA	FONDEPES	9,015,792	7,955,225	8,127,772	90%	68%	EJECUCION	914,029	172,547	19%	0	0	172,547
14	96859	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA	FONDEPES	10,053,921	8,687,942	8,821,339	88%	90%	EJECUCION	1,333,171	133,397	10%	0	0	133,397
15	232325	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	FONDEPES	10,143,643	5,897,037	5,897,037	58%	9%	PARALIZADA	2,219,009	0	0%	0	0	0
16	67963	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA	FONDEPES	12,649,886	453,373	490,525	4%	0%	CONVOCATORIA	11,945,135	37,152	0%	2,920	19,673	14,558
	293780	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION, DISTRITO EL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	ITP	9,409,682	418,758	2,806,353	30%	43%	EJECUCION	8,980,924	2,387,594	27%	641,845	1,343,306	402,443
18	311140	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGROINDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	ITP	1,117,185	516,087	776,612	70%	91%	EJECUCION	1,090,169	260,524	24%	1,040	208,248	51,237

MINISTERIO DE LA PRODUCCION - Oficina de Programación e Inversiones
J. Valdivia V.

MINISTERIO DE LA PRODUCCION - Oficina de Programación e Inversiones
A. MARQUINA

N°	DATOS DEL PROYECTO			EJECUCION DEL PIP				EJECUCION FISICA (INFRAESTRUCTURA)		EJECUCION PRESUPUESTAL 2016			I TRIMESTRE 2016		
	Código SNIP	NOMBRE DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA	MONTO DE INVERSION	EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA - 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA AL I- TRIMESTRE 2016	AVANCE PRESUPUESTAL CON REPECTO AL PIP	AVANCE DE EJECUCION FISICO VALORIZADO A MARZO - 2016	ESTADO DE OBRA A MARZO -2016	PIM 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL I TRIMESTRE- 2016	AVANCE PRESUPUESTAL CON RESPECTO AL PIM 2016. I-TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR
19	2261528	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTOS, HORTALIZAS Y HIERBAS AROMATICAS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	ITP	5,900,811	1,703,030	2,065,713	35%	59%	EJECUCION	3,260,813	362,683	11%	1,480	342,864	18,339
20	2261544	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE UVA, PALTA Y OREGANO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL, EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	ITP	6,668,510	848,076	1,854,489	28%	44%	EJECUCION	4,813,555	1,006,414	21%	0	710,284	296,130
21	2267446	CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMESTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCAVELICA, AYACUCHO Y APURIMAC	ITP	19,614,214	349,060	350,252	2%	0%	BUENA PRO	12,233,819	1,192	0%	1,260	412	-480
22	315865	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	ITP	10,080,642	487,439	1,017,976	10%	0%	EJECUCION	7,957,733	530,537	7%	640	814	529,083
23	316626	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES DE LOS PRODUCTOS DE LA CHIRIMOYA, DURAZNO, PALTA Y VID DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAURA, REGION LIMA	ITP	6,294,440	2,182,464	2,780,097	44%	100%	FINALIZADO	4,021,859	597,633	15%	0	257,366	340,266

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Oficina de Programación e Inversiones
A. Valdivia V.

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Oficina de Programación e Inversiones
A. MARQUINA

N°	DATOS DEL PROYECTO			EJECUCION DEL PIP				EJECUCION FISICA (INFRAESTRUCTURA)		EJECUCION PRESUPUESTAL 2016			I TRIMESTRE 2016		
	Código SNIP	NOMBRE DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA	MONTO DE INVERSION	EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA - 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA AL I- TRIMESTRE 2016	AVANCE PRESUPUESTAL CON REPECTO AL PIP	AVANCE DE EJECUCION FISICO VALORIZADO A MARZO - 2016	ESTADO DE OBRA A MARZO -2016	PIM 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL I TRIMESTRE- 2016	AVANCE PRESUPUESTAL CON RESPECTO AL PIM 2016. I-TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR
24	16573	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTOS TROPICALES Y ACUICOLA EN LA REGION LORETO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS	ITP	10,658,407	4,374,791	5,229,251	49%	70%	EJECUCION	5,424,781	854,459	16%	0	256,959	597,500
25	316984	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	ITP	10,789,991	374,823	2,558,237	24%	1%	EJECUCION	8,529,306	2,183,414	26%	0	1,496	2,181,919
	316160	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN LA REGION DE UCAYALI	ITP	10,122,332	405,404	2,360,333	23%	7%	EJECUCION	8,017,930	1,954,929	24%	0	642,607	1,312,322
27	316135	CREACION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS EN LA REGION MOQUEGUA	ITP	9,906,711	971,131	2,228,664	22%	29%	EJECUCION	7,026,040	1,257,533	18%	1,140	1,128,425	127,968
28	316943	CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA Y LA AGROINDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CASTAÑA, CACAO Y COPOAZU, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	ITP	16,334,134	4,528,412	5,303,578	32%	23%	EJECUCION	9,791,492	775,166	8%	740	287,777	486,650

J. Valdivia V.

A. MARQUINA

N°	DATOS DEL PROYECTO			EJECUCION DEL PIP				EJECUCION FISICA (INFRAESTRUCTURA)		EJECUCION PRESUPUESTAL 2016			I TRIMESTRE 2016		
	Código SNIP	NOMBRE DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA	MONTO DE INVERSION	EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA - 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA AL I- TRIMESTRE 2016	AVANCE PRESUPUESTAL CON REPECTO AL PIP	AVANCE DE EJECUCION FISICO VALORIZADO A MARZO - 2016	ESTADO DE OBRA A MARZO -2016	PIM 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL I TRIMESTRE- 2016	AVANCE PRESUPUESTAL CON RESPECTO AL PIM 2016 I-TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR
29	316178	INSTALACION DE SERVICIOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN LA ACTIVIDAD MINERO ARTESANAL, EN LOS DISTRITOS DE MADRE DE DIOS, HUEPETUHE Y LABERINTO DE LAS PROVINCIA MANU Y TAMBOPATA DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	ITP	8,248,918	542,879	544,359	7%	0%	CONVOCATORIA	5,570,606	1,480	0%	0	480	1,000
30	315866	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA DEL CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL) DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	ITP	18,496,336	676,846	4,076,090	22%	5%	EJECUCION	15,440,558	3,399,244	22%	0	1,116,803	2,282,442
31	316144	CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CUERO Y CALZADO, DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	ITP	12,119,987	639,796	3,303,481	27%	44%	EJECUCION	8,253,656	2,663,685	32%	844,006	16,630	1,803,048
32	316150	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA EN EL DEPARTAMENTO AREQUIPA	ITP	6,298,765	313,864	2,124,956	34%	25%	EJECUCION	4,670,554	1,811,093	39%	521,367	1,050,762	238,964
33	316149	CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE Y CACAO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN EL VRAEM	ITP	9,685,366	1,876,289	2,122,790	22%	57%	EJECUCION	4,590,397	246,501	5%	2,130	91,286	153,085

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN - Oficina de Programación e Inversiones
J. Valdivia V

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN - Oficina de Programación e Inversiones
A. MARQUINA

N°	DATOS DEL PROYECTO				EJECUCION DEL PIP				EJECUCION FISICA (INFRAESTRUCTURA)		EJECUCION PRESUPUESTAL 2016			I TRIMESTRE 2016		
	Código SNIP	NOMBRE DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA	MONTO DE INVERSION	EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA - 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA AL I- TRIMESTRE 2016	AVANCE PRESUPUESTAL CON REPECTO AL PIP	AVANCE DE EJECUCION FISICO VALORIZADO A MARZO - 2016	ESTADO DE OBRA A MARZO -2016	PIM 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL I TRIMESTRE- 2016	AVANCE PRESUPUESTAL CON RESPECTO AL PIM 2016. I-TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR
34	323251	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA EN LA UNIDAD TECNICA MUELLE BARCO CHUCUITO, DISTRITO DE CHUCUITO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	ITP	7,984,605	58,500	58,500	1%	0%	BUENA PRO	3,666,463	0	0%	0	0	0
35	316166	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTOS, HORTALIZAS, MENESTRAS Y GRANOS ANDINOS EN LAS REGIONES DE ICA, JUNIN, AYACUCHO Y HUANCAVELICA	ITP	9,821,593	591,585	2,257,386	23%	0%	EJECUCION	19,306,443	1,665,800	9%	0	690	1,665,110
36	322645	CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFE, CACAO Y FRUTAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN LA ZONA DE SANTA LUCIA, PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO Y AMBO EN EL DPTO DE HUANUCO Y EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA EN EL DPTO DE PASCO	ITP	19,715,383	2,473,130	6,174,299	31%	39%	EJECUCION	8,655,015	3,701,169	43%	1,992,692	1,163,370	545,108
37	325418	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA GENERACION DE VALOR AGREGADO EN LA INDUSTRIA DE LA MADERA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGION UCAYALI	ITP	42,958,159	385,668	390,517	1%	0%	BUENA PRO	42,201,308	4,849	0%	0	1,645	3,204

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Oficina de Programación e Inversiones J. Valdivia V.

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN A. MARQUINA

	DATOS DEL PROYECTO				EJECUCION DEL PIP				EJECUCION FISICA (INFRAESTRUCTURA)		EJECUCION PRESUPUESTAL 2016			I TRIMESTRE 2016		
N°	Código SNIP	NOMBRE DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA	MONTO DE INVERSION	EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA - 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA AL I- TRIMESTRE 2016	AVANCE PRESUPUESTAL CON REPECTO AL PIP	AVANCE DE EJECUCION FISICO VALORIZADO A MARZO - 2016	ESTADO DE OBRA A MARZO -2016	PIM 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL I TRIMESTRE- 2016	AVANCE PRESUPUESTAL CON RESPECTO AL PIM 2016. I-TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR
38	327211	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA EN LA LOCALIDAD DE AHUASHIYACU, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	ITP	14,661,385	192,191	1,454,266	10%	0%	EJECUCION	9,549,284	1,262,075	13%	0	0	1,262,075
39	23229	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS ACUICOLAS EN LA UNIDAD TECNICA SECHURA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA	ITP	13,394,503	0	0	0%	0%	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	1,085,195	0	0%	0	0	0
40	318109	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA	SANIPES	17,748,944		0	0%	0%	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	8,827,649	0	0%	0	0	0
-	-	*ESTUDIOS DE PREINVERSION DEL SECTOR*	-	-	-	-	-	-	-	*4,165,540*	*577,586*	*14%*	*0*	*308,238*	*269,348*

Fuente: Banco de Proyectos SNIP, SIAF, Infobras, reportes de ejecución de los pliegos.
(*) Presenta monto por laudo y/o resolución (DPA Morín: S/ 5, 799,803 y DPA Bahía Blanca: S/ 2, 920,361

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN - Oficina de Programación e Inversiones
J. Valdivia V.
